



1.10.2025

Tilannekatsaus
kunnanhallitukselle

Pukkikuitu Oy/ hallitus

Valmiusaste:

- Alle 5 % verkosta rakentamatta
- 29.9.25 tekemättä: Kantele 6 km, Savijoki 1,5 km
- Lisäksi kaapelien hitsaukset, verkon kytkentä, tekniset testaukset
- Työt saadaan tehtyä aikataulun puitteissa





Tilaajamäärät:

- Tavoite v. 2021 oli 285 tilaajaa ja silloinen ennuste +75 tilaajaa/ 5 vuoden sisällä
- 09/ 2025 tilaajia on **360 kpl**

Toimivat liittymät 09/2025 :

- Kytketty 120 laskutusasiakasta
- 40 asiakasta ottaa verkon käyttöön myöhemmin (12 kk sisällä kytkennästä)
- Loput 200 saadaan kytkettyä joulukuu/2025- tammikuu/2026 (joista osa ottanee verkon käyttöön myöhemmin 12 kk sisällä kytkennästä)




Pukkilaan miljoonien eurojen alokuituverkko

Voittanut Pukkikultu
Aika: 25 + 0 sekuntia lukemiseen *



adidas



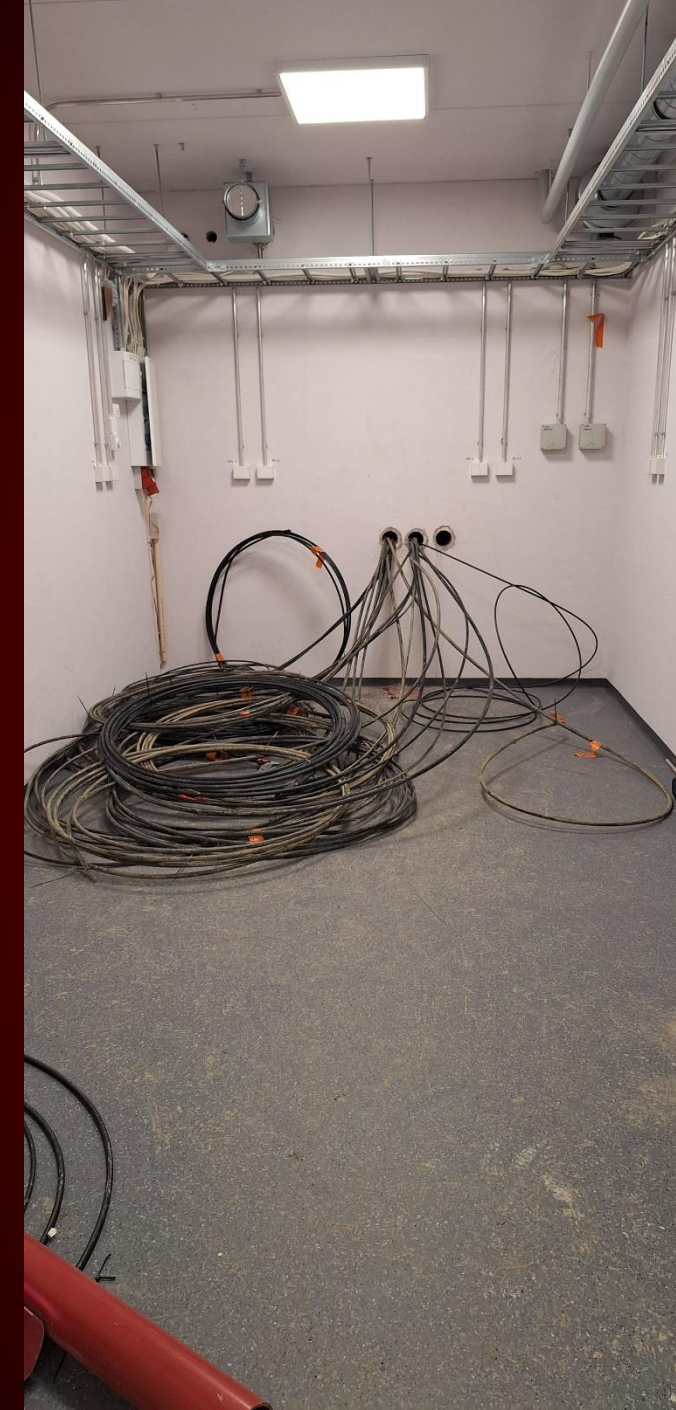

Onnistumiset:

- Budjetti pitänyt
- Haja-asutusalueen aikataulu pitänyt
- Haja-asutusalueen rakennusjälki hyvää
- Rakennusvaiheessa ei ole tullut odottamattomia yllätyksiä maaston suhteen
- Asiakasreklamaatioita kohtuullinen määrä verrattuna tilaajien määrään ja kaikista ongelmista on päästy eteenpäin
- Suunniteltu tekniikka on osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi
- Tilaajamäärän kasvu (v.-21 285 → nyt 360)

Haasteet:

- Luvituksessa mennyt enemmän aikaa kuin suunniteltu (maanomistajat)
- Keskustan urakoitsijan Cinia (heiltä puuttunut sopimuksen mukainen valvoja!)
(kun puutteista huomautettu, vastaus ”korjataan myöhemmin”, mikä ei ole kuitenkaan toteutunut)
- Aikataulupaine (ELY:n tuki projektille v.-25 loppuun)
- Yhtiön toiminnan sujuvuus projektin jälkeen (asiakaspalvelu ja ylläpitopalvelu kilpailuttamatta)





Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus



Pukkikuitu Oy:n valokuituverkon rakentaminen 2024-2025

Pääurakoitsija:



Tilaaja:



Pukkikuitu Oy



Funded by
the European Union
NextGenerationEU



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



Riskit:

- Asiakaskato/poismuutto
- Laitetila vaurioituu (tulipalo tms.)
vakuutukset on, mutta toiminta pakosta keskeytyisi hetkeksi
- Vahingonteot/ilkivalta/piilevät viat
- Laiterikot
- Verkkohyökkäys/maailmantilanne
- Mainehaitta/ some/ mustamaalaaminen /
negatiivinen julkisuus



Kaapeli: 4-k FYO2PMU 4*SML - 292.1m J211-P428

Tiedot
Yleiset
Liitteet (0)
Vuokrasopimukset (0)

Omistaja :

Tunnus : J211-P428

Pituus : 292.1 292.1

Alkuluk(m) :

Mittaustapa : Kartalta

Kommentit :

Tyyppi : Kuitu 4-k FYO2PMU 4*SML

Rooli : Tilaajakaapeli

Tärkeysluokka :

Tukikelp. pituus : 192.1 ☒ Autom.

Vuokraaja :

Käyttötila : Suunniteltu

Asennusvuosi :

Loppuluk(m) :

Asennustapa : Maa

Erä :

Erätunnus :

Alue :

Suunnitelma : Pukkila

☐ Autom.

☐ Kaikki

Kytkennät : P428 asiakaspää

J211

Info

Kaapeli Verkoalue	Tunnus	Tyyppi	Sijaintitarkkuus
	J211-J204	192-k FZVD2PMU Flex 16*12SML	
	J211-J178	48-k FZVD2PMU Flex 4*12SML	
	J211-P375	4-k FYO2PMU 4*SML	
	J211-P429	4-k FYO2PMU 4*SML	
	J211-P428	4-k FYO2PMU 4*SML	

Kanava Verkoalue	Tunnus	Kanavatyyppi	Sijaintitarkkuus
	Tukikelvoton reitti	Tukikelvoton	
	Tukikelpoinen	Tukikelpoinen	

Teletila Verkoalue	Tunnus	Tyyppi	Nimi	Omistaja	Katuosoite	Sijaintitarkkuus
	P428	asiakaspää			HAUTJÄRVENTIE 26	

Kaapeli: 4-k FYO2PMU 4*SML - 292.1m J211-P428

Tiedot
Yleiset
Liitteet (0)
Vuokrasopimukset (0)

Omistaja :

Tunnus : J211-P428

Pituus : 292.1 292.1

Alkuluk(m) :

Mittaustapa : Kartalta

Kommentit :

Tyyppi : Kuitu 4-k FYO2PMU 4*SML

Rooli : Tilaaajakaapeli

Tärkeysluokka :

Tukikelp. pituus : 192.1 ☒ Autom.

Vuokraaja :

Käyttötila : Suunniteltu

Asennusvuosi :

Loppuluk(m) :

Asennustapa : Maa

Erä :

Erätunnus :

Alue :

Suunnitelma : Pukkila

☐ Autom.

☐ Kaikki

Kytkennot : P428 asiakaspää

J211

Info

Kaapeli Verkoalue	Tunnus	Tyyppi	Sijaintitarkkuus
	J211-J204	192-k FZVD2PMU Flex 16*12SML	
	J211-J178	48-k FZVD2PMU Flex 4*12SML	
	J211-P375	4-k FYO2PMU 4*SML	
	J211-P429	4-k FYO2PMU 4*SML	
	J211-P428	4-k FYO2PMU 4*SML	

Kanava Verkoalue	Tunnus	Kanavatyyppi	Sijaintitarkkuus
	Tukikelvoton reitti	Tukikelvoton	
	Tukikelpoinen	Tukikelpoinen	

Teletila Verkoalue	Tunnus	Tyyppi	Nimi	Omistaja	Katuosoite	Sijaintitarkkuus
	P428	asiakaspää			HAUTJARVENTIE 26	



Kokouksessa esitellään tarkemmin
Pukkikuidun hallituksen laatima
talouskatsaus.

